

DIVISION DE INVERSION PUBLICA

**DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES**



CONTENIDO

PIM ASIGNADO

META 020 – PRE INVERSION PERFIL

META 027 – INVERSION EXPEDIENTE TECNICO

META 030 – PRE INVERSION PERFIL

META 032 – PRE INVERSION FACTIBILIDAD

META 035 – PRE INVERSION FACTIBILIDAD


META 036 – PRE INVERSION FACTIBILIDAD

PIM ASIGNADO

PRE-INVERSION \$/. 507,232.00

INVERSION \$/. 92,768.00

EJECUCION PIM PRE INVERSION

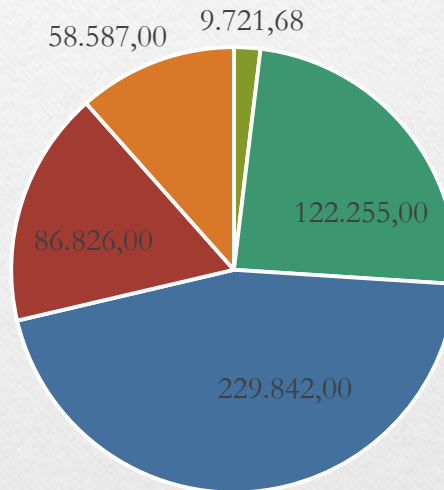

■ META 020 ■ META 030 ■ META 032 ■ META 035 ■ META 036



ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOREMAD PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INTEGRACION, CONSERVACION VIAL Y LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE HUAPETUHE Y REGION MADRE”

- PIM : S/. 9,721.68
- PAGADO: **S/. 9,721.68**
- INICIO DE ACTIVIDAD:
- Todas actividades se realizaron en los meses de Enero a Febrero del 2016



ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL RUTA MD 100 TRAMO EMP. PE 30C (MAZUKO) - PUERTO MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS”

- **PIM : S/. 92,768.00**
- **CERTIFICACION AL 24 - 10 – 2016: S/. 85,582.75**
- **INICIO DE ACTIVIDAD:**
- **Presentación de requerimiento: 25 de Mayo 2016**
- **Ingreso abastecimiento: 30 de Mayo 2016**
- **Certificación: 01 de Julio 2016**
- **Aprobación de expediente de contratación: 07 de Julio 2016**



Publicación en el SEACE y ejecución de convocatoria


- **Primera Convocatoria:** 18 de Julio 2016

Nota: No se presento ningún postor

- **Segunda Convocatoria:** 11 de Agosto 2016

Nota: Se presento un solo postor el cual no cumplió con lo descrito en los términos de referencia.

- **Segunda Convocatoria:** 26 de Setiembre 2016

Nota: Se presentaron dos postores el cual solo uno  cumplió con lo descrito en los términos de referencia.



OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005 - 2016 – DRTC - MDD

- **Otorgamiento de buena pro:** 12 Octubre 2016
- **Firma de contrato:** Actualmente se encuentra en la etapa de requisitos para la suscripción del contrato, fecha limite para firma del mismo 4 de noviembre.
- **Plazo de ejecución:** 45 días calendario
- **Longitud de camino proyectado:** 3.00 km
- **Entrega tentativa de proyecto :** 20 Diciembre 2016



ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MD - 509 EMP. MD 101 - EMD. PD 508 (RIO PUKIRI), DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, MADRE DE DIOS”

- **PIM INICIAL:** S/. 77,769.33
- **PIM MODIFICADO:** S/. 122,255.00
- **CERTIFICACION AL 24 - 10 - 2016:** **S/. 122,254.59**
- **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO:**
 - **Presentación área usuaria:** 06 de Mayo 2016
 - **Aprobación OPI – GOREMAD:** 26 de Mayo 2016
- **Plazo de Ejecución:** 60 días calendarios



GASTOS REALIZADOS Y AVANCES

- **GASTOS**
 - **BIENES:** S/. 11,076.62
 - **SERVICIOS:** S/. 32,432.00
 - **REMUNERACION:** S/. 78,745.97
 - **AVANCES 70%**
 - **PARTE TECNICA:** Levantamiento topográfico, estudio de suelos, evaluación para clasificación ambiental, conteo de trafico, inventario vial, diseño de vía.
 - **PARTE ECONOMICA:** Aspectos generales y identificación.
- FALTA:**
- **PARTE TECNICA:** Diseño de alcantarillas y presupuesto de alternativas.
 - **PARTE ECONOMICA:** Formulación y evaluación

ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA, CHORRILLOS, TUPAC AMARU Y TRES ISLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS”

- **PIM INICIAL:** S/. 229,842.00
- **CERTIFICACION AL 24 - 10 - 2016:** **S/. 67,836.67**
- **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO:**
 - **Presentación área usuaria:** 01 de Julio 2016
 - **Aprobación OPI – GOREMAD:** 24 de Agosto 2016
 - **Plazo de Ejecución:** 120 días calendarios




GASTOS REALIZADOS Y AVANCES

- **GASTOS**
 - **BIENES:** S/. 9,207.72
 - **SERVICIOS:** S/. 27,622.73
 - **REMUNERACION:** S/. 31,006.22
 - **POR CERTIFICAR:** S/. 162,005.33
- **AVANCES 40 %**
 - **PARTE TECNICA:** Levantamiento topográfico, estudio de suelos, evaluación para clasificación ambiental, conteo de trafico, inventario vial, diseño de vía (100%) estudio de hidrología y geotecnia diseño estructural de obras de arte, estudio de señalización y seguridad vial, metrados, presupuesto, evaluación ambiental (5%)
 - **PARTE ECONOMICA:** Aspectos generales y identificación.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL; INICIO DESVIO MARGEN DERECHA KM. 62 VIA INTEROCEÁNICA (PE. 30C) TRAMO VIRGENES DEL SOL - COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL INAMBARI, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS”

- **PIM : S/. 86,826.00**
- **CERTIFICACION AL 24 - 10 – 2016: S/. 86,800.00**
- **INICIO DE ACTIVIDAD:**
- **Presentación de términos de referencia: 01 de Junio 2016**
- **Aprobación OPI – GOREMAD: 22 de Junio 2016**
- **Presentación de requerimiento: 10 de Agosto 2016** 



Publicación en el SEACE y ejecución de convocatoria

- **Ingreso abastecimiento:** 11 de Agosto 2016
- **Certificación:** 19 de Agosto 2016
- **Aprobación de expediente de contratación:** 24 de Agosto 2016
- **Primera Convocatoria:** 29 de Agosto 2016

Nota: Se presento un solo postor



OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006 - 2016 – DRTC - MDD

- **Otorgamiento de buena pro:** 09 Setiembre 2016
- **Firma de contrato:** 28 Setiembre 2016
- **Costo de la consultoría:** S/. 85,064.00
- **Plazo de ejecución:** 44 días calendario
- **Longitud de camino proyectado:** 14.50 km
- **Entrega de proyecto:** 12 Noviembre 2016



ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL; INICIO DESVIÓ MARGEN DERECHA KM. 92 VÍA INTEROCEÁNICA (PE. 30C) TRAMO SOL NACIENTE - HUACAMAYO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS”

- **PIM : S/. 58,587.00**
- **CERTIFICACION AL 24 - 10 – 2016: S/. 58,500.00**
- **INICIO DE ACTIVIDAD:**
- **Presentación de términos de referencia: 28 de Junio 2016**
- **Aprobación OPI – GOREMAD: 14 de Julio 2016**
- **Presentación de requerimiento: 10 de Agosto 2016**



Publicación en el SEACE y ejecución de convocatoria

- **Ingreso abastecimiento:** 11 de Agosto 2016
- **Certificación:** 19 de Agosto 2016
- **Aprobación de expediente de contratación:** 24 de Agosto 2016
- **Primera Convocatoria:** 29 de Agosto 2016

Nota: Se presentaron dos postores



OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 - 2016 – DRTC - MDD

- **Otorgamiento de buena pro:** 09 Setiembre 2016
- **Firma de contrato:** 30 Setiembre 2016
- **Costo de la consultoría:** S/. 57,330.00
- **Plazo de ejecución:** 45 días calendario
- **Longitud de camino proyectado:** 11.10 km
- **Entrega de proyecto:** 14 Noviembre 2016

